LEGENDE :

- Baustellenzufahrt
  Patientenzufahrt
  Feuerwehrumfahrung
- Fußgängerweg
- Baustellenabgrenzung

Schwenkbereich
Kran 1 (R: 40 m)

Baustellen-
ausfahrt

Feuerwehr-
zufahrt

Bahnlinie Traunstein - Garching

Baustellen-
zufahrt

Feuerwehrzufahrt

Parkhaus
Fußgängerweg
Bestand

Kran 1
L = 40 m
H = 30 m

FW

Treppe neu
9 STG
17,0/28,0

608,54
(Gelände)

610,07
(Gelände)

608,54
(Gelände)

Rampe neu
Ab Rohbauoberkante
Steigung: 1,53 %

Treppe neu
9 STG
17,0/28,0

Abstützung
Mobilkran

Lagerfläche
für Bauscontainer

2,00
lastfrei

Fahrzeuge
zul. Achslast nach
StVzo bis 40 to

2,50

Bauwasseranschluss
an Hydrant

Notstrom-
aggregat

BA 1
Neubau
Nord

VI

V

I

Abstützung
Mobilkran

Fahrzeuge
zul. Achslast nach
StVzo bis 40 to.

Kran 2
L = 50 m
H = 30 m

3 x Sanitär-
container
1 x einstöckig
1 x zweistöckig

6,00

Engstelle 3,1 m
Überschneidung

VII

BT 12

VI

VI

Schwenkbereich
Kran 2

Parkdeck

Baueinrichtungscontainer
für Baustelle;
mittig auf dem Parkhaus
zu stellen

prov.
Pforte

III

Kapelle

III

Firmen PKW

Parkhaus
Fußgängerweg
Bestand

BEMERKUNGEN :

PLÄNE SIND NUR IM ZUSAMMENHANG MIT DEN ABBRUCH- UND MUSTERRAUMPLÄNEN GÜLTIG

ALLE MASSE SIND VOM UNTERNEHMER GENAU ZU PRÜFEN UND ZU VERGLEICHEN.
UNSTIMMIGKEITEN SIND DER BAULEITUNG SOFORT ZU MELDEN.

ES DARF NUR NACH ARCHITEKTENPLÄNEN GEMAUERT WERDEN.

DIE AUFLAGEN DER BAUGENEHMIGUNG SIND ZU BEACHTEN.

DIESER PLAN GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DEN PLÄNEN DES STATIKERS, DER FACHINGENIEURE UND FACHFIRMEN.

TÜR- UND BRÜSTUNGSHÖHEN SIND ROHBAURICHTMASSE UND BEZIEHEN SICH AUF OKFF. ALLE BESTANDSÖFFNUNGEN SIND VOR ORT ZU MESSEN.

FÜR ABGEHAENGTE DECKEN UND BODENBELÄGE SIND GESONDERTE VERLEGE-PLÄNE ZU BEACHTEN.

SÄMTLICHE WÄNDE SIND BIS UK-ROHDECKE BZW. UNTERZUG HOCHZUFÜHREN.

SÄMTLICHE DURCHBRÜCHE IN DEN WÄNDEN UND DECKEN SIND NACH DER INSTALLATION GEMÄSS DEN BRANDSCHUTZVORSCHRIFTEN UND WANDQUALITÄTEN VON DEN ENTSPRECHENDEN GEWERKEN ZU SCHLIESSEN.

ALLE TRASSENFÜHRUNGEN IN DEN FLUREN SIND VON DEN INSTALLATIONSFIRMEN GEMÄSS DEN BRANDSCHUTZVORSCHRIFTEN ABZUSCHOTTEN.

DIE MONTAGE DER GIPSKARTONWÄNDE ERFOLGT AUF DEM ROHFUSSBODEN

HÖHENANGABEN SIND DEN DECKENPLÄNEN ZU ENTNEHMEN!

INDEX	DATUM	NAME	DECKBL.	BEMERKUNG
A	04.09.19	Ch		Anpassung Kräne, Baucontainer

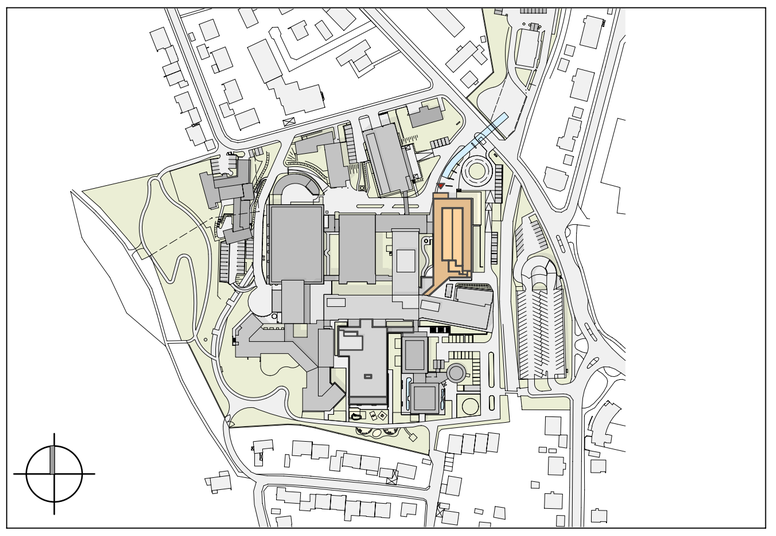

± 0.00 = 610.11 ü.NN

KLINIKUM TRAUNSTEIN - BA 1 NEUBAU NORD

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

PLANINHALT

Baustelleneinrichtungsplan

VORABZUG

PROJEKT NR.	DATUM	MAßSTAB
KOT02-17	09.01.2020	1:250
PLANBEZ.		

BAUHERR:

Kliniken Südostbayern
Cuno-Niggl-Straße 3
83278 Traunstein

DATUM, UNTERSCHRIFT BAUHERR

ARCHITEKT:

LUDES ARCHITEKTEN - INGENIEURE GMBH

BEETHOVENPLATZ 4
80336 MÜNCHEN
TEL.: 089 / 9292777-0
FAX: 089 / 9292777-29

LUDES

DATUM, UNTERSCHRIFT ARCHITEKT

FACHPLANUNG:

DATUM, UNTERSCHRIFT FACHPLANUNG
