Schalung und Einbauteile

SEITENANSICHT

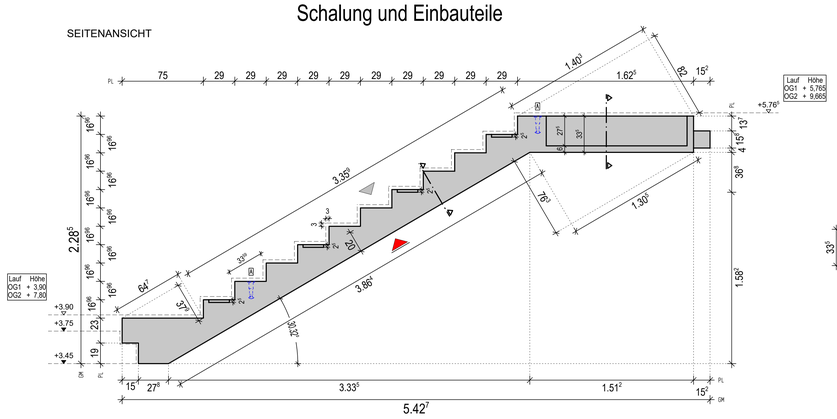

ANSICHT FÜLLSEITE

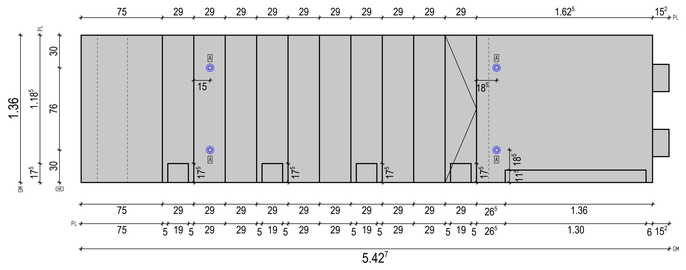

3D Ansicht

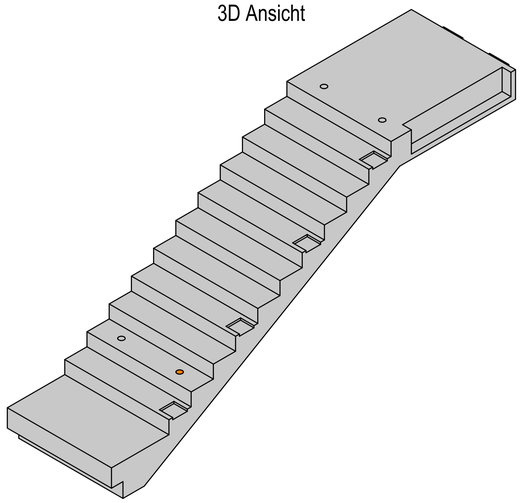

Schnitt Laufplatte



Schnitt Podest



Bewehrung

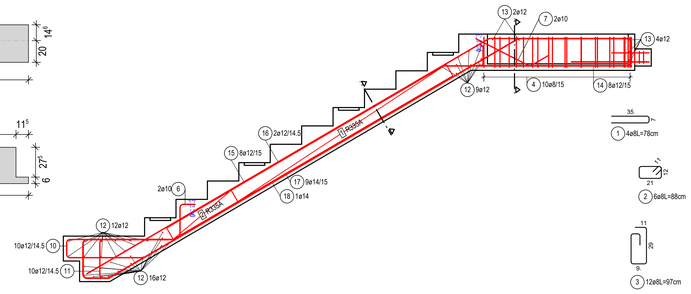









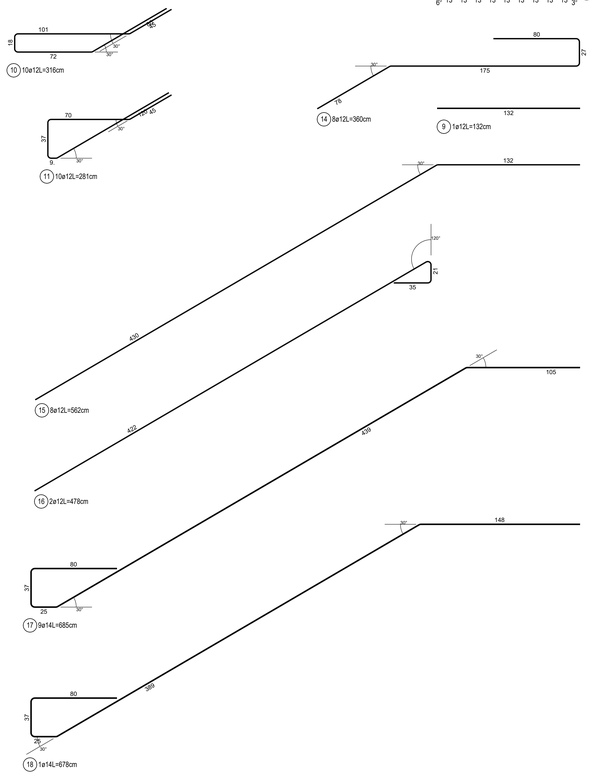

Mattenliste

PosNr	Stück	Mattenbezeichnung	Länge [m]	Breite [m]	Masse [kg]
1	1	R335A	3.260	2.300	27.28
2	1	R335A	3.260	0.690	8.18

Gesamtmasse [kg] : 35.46

Stabliste

Pos.	Stck	ø [mm]	Einzel Länge [m]	Gesamt Länge [m]	Masse [kg]
1	4	8	0.78	3.12	1.23
2	6	8	0.88	5.28	2.09
3	12	8	0.97	11.64	4.60
4	10	8	3.18	31.80	12.56
5	10	8	3.77	37.70	14.89
6	2	10	1.47	2.94	1.81
7	2	10	1.58	3.16	1.95
8	4	12	1.52	6.08	5.40
9	1	12	1.32	1.32	1.17
10	10	12	3.16	31.60	28.06
11	10	12	2.81	28.10	24.95
12	37	12	1.31	48.47	43.04
13	6	12	1.20	7.20	6.39
14	8	12	3.60	28.80	25.57
15	8	12	5.62	44.96	39.92
16	2	12	4.78	9.56	8.49
17	9	14	6.85	61.65	74.47
18	1	14	6.78	6.78	8.19

Gesamtmasse [kg] : 304.78

TRANSPORTANKER VOR KORROSION SCHÜTZEN !!!

TREPPE

Steigungsverhältnis	11 STG 16.96/29.0
Laufplatte	Breite: 1,36m Dicke: 20cm
Belag	3,0/3,0 cm
Einstellmaß Hypothenuse	22x:739.06 cm 18x:604.68 cm

BETONDECKUNG

BAUTEIL oben	unten	seitlich
3,0	3,0	3,0
KONSOLE oben	unten	seitlich
3,0	3,0	3,0

FASE

3 KANTLEISTE x=mm	---
SILIKON r=3mm	3mm

EINBAUTEILE

Pos.	Artikelnummer	Bezeichnung	Stück	Länge	Fläche
A	0216054	Schraubanker RD30 4.0to verz.	4		

PRODUKTIONSHINWEIS

SCHALUNGSART	ERZEUGNISNUMMER
IN EINBAULAGE	40
ENDBEHANDLUNG	

TRANSPORT-ABMESSUNG

LÄNGE:	m	5,68
BREITE	m	1,52
HÖHE:	m	1,39

BEWEHRUNG

Stahlgüte	Eisengewicht
B500 A	340.26 kg
Biegerollendurchmesser	

ds [mm]	dBr [mm]
6, 8, 10, 12	4ds min ds = 40 mm
14, 16	4ds min ds = 64 mm
20, 25, 30, 35	7ds min ds = 175 mm

BETON

BETONMENGE	GEWICHT
2.31 m³	6.05 to
BETONGÜTE	EXP-KLASSEN
C30/37	XC1/WO/F90
EINFÄRBUNG	

REZEPTNUMMER	---

LEGENDE

SCHALSEITE
- text-Symbol: SCHALGLATT
- MATRITZE (Struktur)

FÜLLSEITE
- ABGEZOGEN
- GEGLÄTTET
- MASCHINELL GEGLÄTTET
- RAU (aufgerauht)

ENDBEARBEITUNG
- SONDER OBERFLÄCHE (sandgestrahlt, gewaschen, gesäuert, gefräst)

INDEX	ÄNDERUNGSVERMERK	BEARBEITER	DATUM
A	Änderungen lt. Architekt eingearbeitet / PRODUKTIONSFREIGABE	TS	16.11.2021
B			
C			
D			
E			
F			
G			
H			

Projekt: NBSt.Georg Grund-u.Mittelschule, Bad Aibling

Auftraggeber: Pfeiffer, Rosenheim

Planinhalt: T9 - TRH3 FT03L OG1-OG3

Plancode - ext Plannr: ---

KURZ FERTIGTEILBAU
Kurz Fertigteilbau Ges.m.b.H.
A-6232 Langkampfen, Kurweg 2
T +43 5 0806 440
office@kurz-fbau.at
www.kurz-fbau.at

GEZEICHNET	ERSTELLDATUM	FREIGABEDATUM	INDEX
TS	25.10.2021	16.11.2021	A
MASSSTAB	PROJEKTNUMMER	PLANNUMMER	ANZAHL
M 1: 20	21621	T9	2
