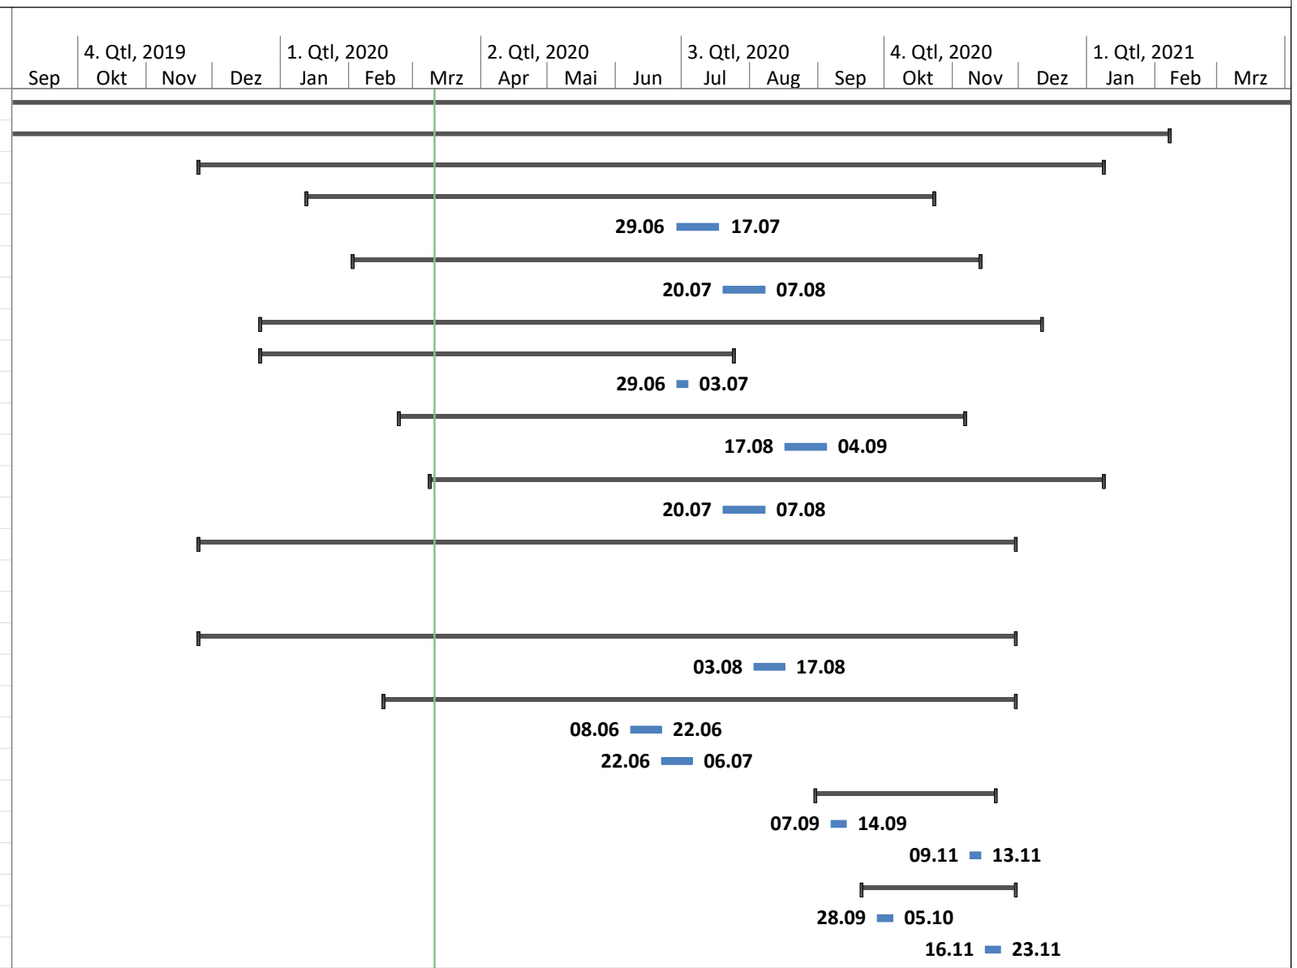Nr.	Gewerk	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
495		**Bauausführung (LPH 8)**	**830 Tage**	**Mon 12.02.18**	**Fre 28.05.21**
798		**Innenausbau**	**525 Tage**	**Mon 07.01.19**	**Mon 08.02.21**
799		**Innenausbau geschossweise**	**275 Tage**	**Mon 25.11.19**	**Fre 08.01.21**
800		**E3**	**205 Tage**	**Mon 13.01.20**	**Fre 23.10.20**
818	10341	Malerarbeiten, Lackierarbeiten	3 Wochen	Mon 29.06.20	Fre 17.07.20
835		**E2**	**205 Tage**	**Mon 03.02.20**	**Fre 13.11.20**
853	10341	Malerarbeiten, Lackierarbeiten	3 Wochen	Mon 20.07.20	Fre 07.08.20
870		**E1**	**245 Tage**	**Mon 23.12.19**	**Fre 11.12.20**
871		**Technikräume**	**145 Tage**	**Mon 23.12.19**	**Fre 24.07.20**
881	10341	Malerarbeiten, Lackierarbeiten	1 Woche	Mon 29.06.20	Fre 03.07.20
883		**Verwaltungs- und Lehrräume + Wohnung Hau**	**185 Tage**	**Mon 24.02.20**	**Fre 06.11.20**
902	10341	Malerarbeiten, Lackierarbeiten	3 Wochen	Mon 17.08.20	Fre 04.09.20
917		**E0**	**210 Tage**	**Mon 09.03.20**	**Fre 08.01.21**
936	10341	Malerarbeiten, Lackierarbeiten	3 Wochen	Mon 20.07.20	Fre 07.08.20
956		**U1**	**255 Tage**	**Mon 25.11.19**	**Mon 30.11.20**
957					
966					
969		**Umkleiden, Geräteräume, Flure, WCs (so spät**	**255 Tage**	**Mon 25.11.19**	**Mon 30.11.20**
983	10341	Malerarbeiten, Lackierarbeiten	2 Wochen	Mon 03.08.20	Mon 17.08.20
994		**Innenausbau Sporthalle (so spät, wie möglich)**	**205 Tage**	**Mon 17.02.20**	**Mon 30.11.20**
1002	10341	Spachtelarbeiten Wände und Unterzüge	2 Wochen	Mon 08.06.20	Mon 22.06.20
1003	10341	Malerarbeiten Sporthalle	2 Wochen	Mon 22.06.20	Mon 06.07.20
1035		**Treppenhaus TH 1**	**60 Tage**	**Mon 31.08.20**	**Fre 20.11.20**
1037	10341	Malerarbeiten, Lackierarbeiten	1 Woche	Mon 07.09.20	Mon 14.09.20
1043	10341	Malernacharbeiten	1 Woche	Mon 09.11.20	Fre 13.11.20
1045		**Treppenhaus TH2**	**50 Tage**	**Mon 21.09.20**	**Mon 30.11.20**
1047	10341	Malerarbeiten, Lackierarbeiten	1 Woche	Mon 28.09.20	Mon 05.10.20
1053	10341	Malernacharbeiten	1 Woche	Mon 16.11.20	Mon 23.11.20
