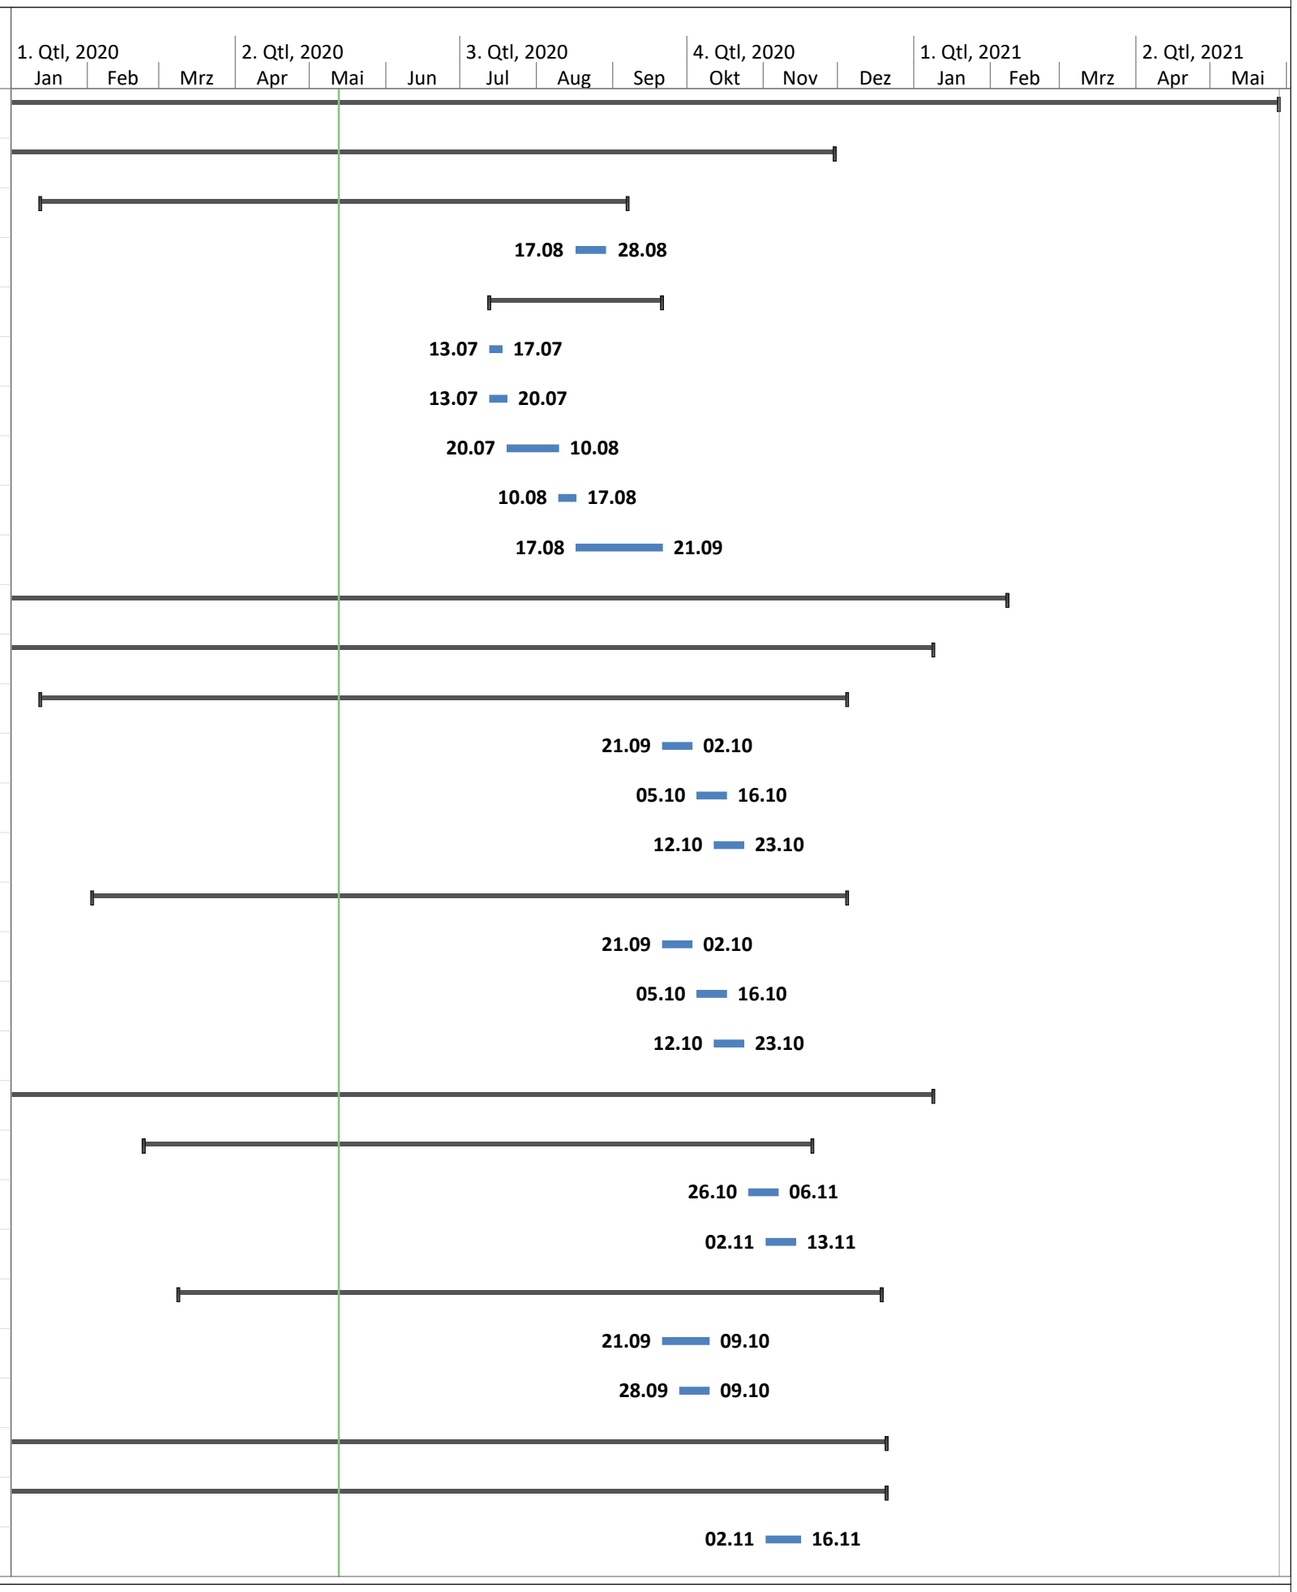Nr.	Gewerk	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
493		**Bauausführung (LPH 8)**	**830 Tage**	**Mon 12.02.18**	**Fre 28.05.21**
494		**Gewerkeeinführung**	**405 Tage**	**Mon 29.04.19**	**Mon 30.11.20**
495		**10273 Schreiner III (mobile Trennwände)**	**170 Tage**	**Mon 13.01.20**	**Mon 07.09.20**
501	10271	Anfertigung Deckplatten Schreiner I	2 Wochen	Mon 17.08.20	Fre 28.08.20
503		**10271 Schreiner I (inkl. Wandbekleidungen)**	**50 Tage**	**Mon 13.07.20**	**Mon 21.09.20**
504	10271	Baustelleneinführung	1 Woche	Mon 13.07.20	Fre 17.07.20
505	10271	Aufmaß	1 Woche	Mon 13.07.20	Mon 20.07.20
506	10271	Vorlage Werkstattzeichnungen	3 Wochen	Mon 20.07.20	Mon 10.08.20
507	10271	Freigabe Architekt	1 Woche	Mon 10.08.20	Mon 17.08.20
508	10271	Produktions-, Lieferzeit	5 Wochen	Mon 17.08.20	Mon 21.09.20
796		**Innenausbau**	**525 Tage**	**Mon 07.01.19**	**Mon 08.02.21**
797		**Innenausbau geschossweise**	**275 Tage**	**Mon 25.11.19**	**Fre 08.01.21**
798		**E3**	**235 Tage**	**Mon 13.01.20**	**Fre 04.12.20**
824	10271	Akustikwandverkleidungen	2 Wochen	Mon 21.09.20	Fre 02.10.20
827	10271	Schreinerarbeiten (Festeinbauten)	2 Wochen	Mon 05.10.20	Fre 16.10.20
828	10271	Einbau Sitz-Fensterbänke	2 Wochen	Mon 12.10.20	Fre 23.10.20
833		**E2**	**220 Tage**	**Mon 03.02.20**	**Fre 04.12.20**
859	10271	Akustikwandverkleidungen	2 Wochen	Mon 21.09.20	Fre 02.10.20
862	10271	Schreinerarbeiten (Festeinbauten)	2 Wochen	Mon 05.10.20	Fre 16.10.20
863	10271	Einbau Sitz-Fensterbänke	2 Wochen	Mon 12.10.20	Fre 23.10.20
868		**E1**	**255 Tage**	**Mon 23.12.19**	**Fre 08.01.21**
881		**Verwaltungs- und Lehrräume + Wohnung Hau**	**195 Tage**	**Mon 24.02.20**	**Fre 20.11.20**
909	10271	Schreinerarbeiten (Festeinbauten)	2 Wochen	Mon 26.10.20	Fre 06.11.20
910	10271	Einbau Sitz-Fensterbänke	2 Wochen	Mon 02.11.20	Fre 13.11.20
915		**E0**	**205 Tage**	**Mon 09.03.20**	**Fre 18.12.20**
949	10271	Schreinerarbeiten (Festeinbauten + Treppe)	3 Wochen	Mon 21.09.20	Fre 09.10.20
950	10271	Einbau Sitz-Fensterbänke	2 Wochen	Mon 28.09.20	Fre 09.10.20
954		**U1**	**270 Tage**	**Mon 25.11.19**	**Mon 21.12.20**
967		**Umkleiden, Geräteräume, Flure, WCs (so spät**	**270 Tage**	**Mon 25.11.19**	**Mon 21.12.20**
988	10271	Schreinerarbeiten (Festeinbauten)	2 Wochen	Mon 02.11.20	Mon 16.11.20
